


令和3年度若洲海浜公園若洲ゴルフリンクスのグリーン等改修工事  
グリーン（本設）ほか築造工事

工期：令和3年4月1日より令和4年3月15日



改修工事の流れ

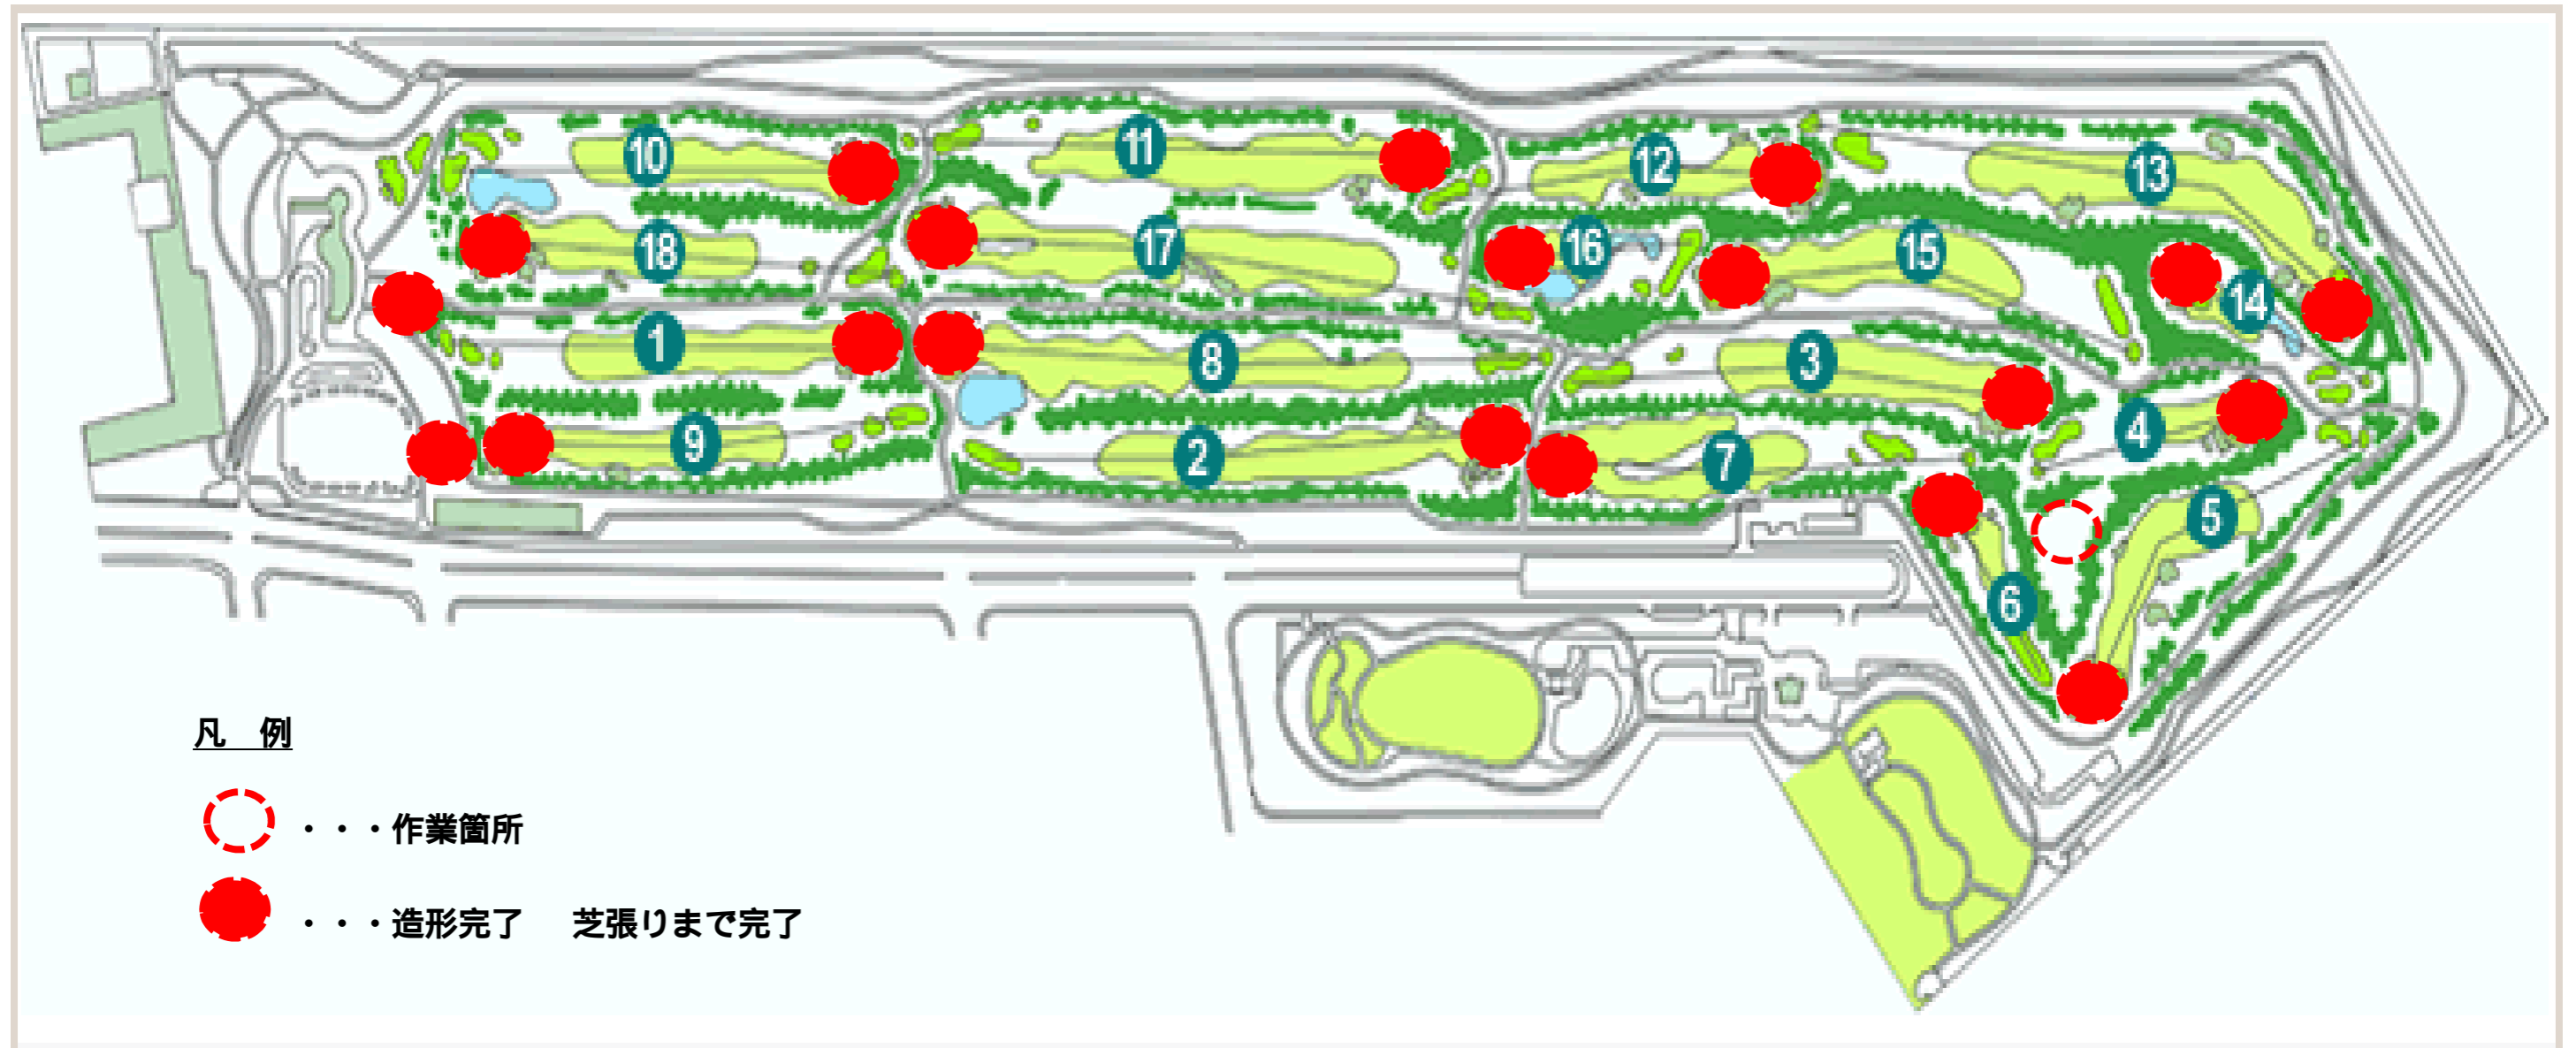

# 《グリーン改修工事の施工方法》



既存グリーン撤去・造形



グリーンの暗渠敷設



グリーン砂敷き均し



グリーン周り芝張り



グリーン種まき・芝生養生



完成

## 【 今 月 の 作 業 状 況 】



芝生養生管理 刈込・施肥薬・散水・目砂散布・ローラー転圧



Hole 5 全景及び接写 グリーン播種後、約7週間経過後の生育状況

